

# Sachstandsbericht der wichtigsten Projekte in Karlsdorf-Neuthard

3.Quartal 2016



# Eckdaten Entwicklung Haushalt 2016

## Stand: 30.06.2016

- Mehreinnahmen Gewerbesteuer 600.000 €
  - Mehrausgaben Gewerbesteuerumlage 121.700 €
  - Erhöhung Kreisumlage (+ 1,5 %) 31 % 172.100 €
  - Zuführung an Vermögenshaushalt = 1.913.700 €  
(= + 340.100 €)
  - Zuführung an Allgemeine Rücklage = 539.000 €  
(= + 152.100 €)
  - Stand der Rücklage per 31.12.16 = 2.300.900 €
  - Nach derzeitigem Stand sind keine Darlehensaufnahmen in 2016 vorgesehen.
- Eine detaillierte Halbjahresbilanz wird in der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause zur Kenntnis gebracht.

# Altenbürgerhalle / Altenbürgstadion Erstellung eines neuen Feuerlöschbrunnens

- **Ziel:** der bestehende Feuerlöschbrunnen an der Altenbürgerhalle ist in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand, die Errichtung eines neuen Brunnens mit hydraulisch günstigerer Mitte der Zuleitung soll die Löschwasserversorgung auch in Zukunft gewährleisten (Reserve für 2. Sporthalle einberechnet)
- **GR:** Vergabe der Brunnenarbeiten am 28.07.15 an die Firma Harsch (Auftragssumme 165.239,40 € brutto)
- Haushaltsstelle EB Wasser 10000, 160.000 €
- **Stand:** Baumaßnahme ist komplett abgeschlossen, endgültige Funktionsprüfung ist erfolgt, Schlussrechnung liegt vor mit einer Abrechnungssumme von 167.618,14 € brutto



# Altenbürgerhalle

## Neubau einer 2. Sporthalle



- **Ziel:** die Altenbürgerhalle reicht für die zahlreichen Aktivitäten nicht aus, durch den Neubau einer 2. Sporthalle (Spielfläche 20\*40m) sollen die Kapazitätsengpässe minimiert werden
- **GR:** Grundsatzbeschluss am 28.06.16
- Haushaltsstelle 2.5610.941000, 2.270.000 €
- **Stand:** Bauantrag und der Zuschussantrag wurden am 22.12.15 gestellt, Bewilligung des Zuschusses von 420.000 € und Ausgleichsstock von 188.000 € liegt vor, Grundsatzbeschluss durch den GMR ist am 28.06.16 erfolgt mit netto Baukosten von 2.496.291 €, Spatenstich noch in 2016 geplant



# Altenbürgerhalle LED-Beleuchtung



- **Ziel:** Austausch der vorhandenen Beleuchtung in der Mehrzweckhalle wegen baulichem Zustand gegen eine LED-Beleuchtung mit einer Beleuchtungssteuerung
- GR: Vergabe der Elektroarbeiten am 23.02.2016 an die Firma Elektro Krieger (Auftragssumme 110.716,70 €)
- Haushaltsstelle 2.5610.940000, 223.000 €
- **Stand:** Zuschuss vom Bundesministerium für Umwelt in Höhe 30.000 € bewilligt, Baumaßnahme ist beendet, Schlussrechnung liegt vor und wird derzeit geprüft
- Kennzahlen der Baumaßnahme:
  - 82% Stromeinsparung, ca. 86.000 kWh pro Jahr
  - 51 t CO<sub>2</sub> Einsparung pro Jahr



# Neubau St. Elisabeth Kindergarten

- **Ziel:** Schaffung von 4 Kleinkindgruppen auf dem Areal des St. Elisabeth Kindergartens, möglichst kompaktes Bauwerk um den Eingriff in das Außengelände so gering wie möglich zu halten, nachhaltig und hochwertiger Baustandard
- **GR:** Vergabe der küchentechnischen Anlagen, Schreinerarbeiten und Außenanlagen am 20.09.16
- Haushaltsstelle 2.4640.987000, 2.100.000 €
- **Stand:** Richtfest fand am 13.07.16 statt, Gebäudehülle ist geschlossen, Estrich ist eingebracht, geplante Fertigstellung Ende November die Kostenfeststellung liegt unter der Kostenberechnung



# Sanierung Bestand St. Elisabeth Kindergarten

- **Ziel:** das bestehende Kindergartengebäude weist erhebliche Mängel in der Elektrotechnik auf, ebenso wird für den Ganztagesbetrieb eine Küche mit entsprechendem Essbereich benötigt, ebenso die fehlenden Funktionsräume und der stark sanierungsbedürftige Wintergarten
- **GR:** Vergabe der küchentechnischen Anlagen am 20.09.16
- **Haushaltsstelle:** 2.4640.987000 , 650.000 €, vom GR sind 560.000,- € genehmigt
- **Stand:** Baugenehmigung für die Wintergartenerweiterung liegt vor, 1. Bauabschnitt ist bereits fertig gestellt (Anfang September), Beginn des 2. Bauabschnitts mit Fertigstellung des Neubaus wegen Auslagerung zweier Gruppen (die Rohbau- und Holzbauarbeiten im Außenbereich wurden in den Sommerferien bereits begonnen)



# Don Bosco Kindergarten - Außenanlagen

- **Ziel:** für den im September 2015 eröffneten Anbau der 3 Krippengruppen muss das Außengelände und der Eingangsbereich noch fertig gestellt werden (Ausführungszeitraum ist abhängig von der Auftragslage der Firmen)
- **GR:** Auftragsvergabe der Planungsleistung für das Außengelände am 12.04.16
- **Haushaltsstelle:** 2.4640.960000, 50.000 €
- **Stand:** die Außenanlagen wurden aufgeteilt und werden von zwei unterschiedlichen Firmen ausgeführt, Kiesstreifen und Eingangsbereich sind bereits errichtet und abgenommen, die Gestaltung des Außengeländes übernimmt die Firma Die Werkstatt aus Heidelberg, möglicher Beginn der Arbeiten im Frühjahr 2017, Vorstellung des Entwurfs im November 2016, die Errichtung des Zauns ist durch den Bauhof erfolgt



19.01.

02.02.

23.02.

15.03.

12.04

03.05



# Ortskernsanierung Neuthard LSP-Programm (Haupt-/Kirchstraße)



- **Ziel:** Entwicklung einer Ortsmitte, Aufwertung der Wohn- und Lebensqualität, Sicherung des Fußgängerverkehrs, Ordnung des ruhenden Verkehrs, Reduzierung der Durchfahrtsgeschwindigkeit
- **GR:** Vergabe der Straßenbau-, Entwässerungskanal-, und Wasserversorgungsarbeiten am 13.10.2015
- **Haushaltsstelle** 2.6150.961800, 1.148.300 €
  - 2.6150.964000, 113.900 €
  - 2.7000.960000-007, 295.500 €
  - EB Wasser 42000, 255.300 €
- **Stand:** Die Arbeiten in der Kirchstraße sind abgenommen, Ende Oktober sollen die Arbeiten in der Hauptstraße abgeschlossen sein, danach folgt der Bau des Minikreisverkehrs je nach Witterung



# Fahrgastunterstände

## Erneuerung der Fahrgastunterstände in beiden OT

- **Ziel:** barrierefreier Ausbau der Fahrgastunterstände, einheitliches Erscheinungsbild aller Standorte um damit die Attraktivität des ÖPNV zu verbessern
- **GR:** Grundsatzbeschluss zur Festlegung des Wartehallentyps am 02.02.16
- **Haushaltsstelle:** 2.7920.940000, 125.000 €
- **Stand:** die ersten drei Fahrgastunterstände sind errichtet und in Betrieb genommen worden 2 Stück bei der Querungshilfe Im Pfad, 1 Stück beim Kreisel Büchenauer Straße



# Sieben-Erlen-See

## Planung dezentrale Wasser-/Abwasserbeseitigung

- **Ziel:** der bestehende Brunnen am Sieben Erlen See und die Klärgrube sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand, Wasser- und Abwasserbeseitigung dezentral oder Anschluss an das Netz überprüfen
- **GR:** 11.10.16 Vorstellung und Vorberatung der Ergebnisse
- **Haushaltsstelle:** keine Mittel in 2016 eingeplant
- **Stand:** bit Ingenieure ist damit beauftragt zu untersuchen in wieweit die Zusammenlegung mit dem TV Neuthard ( Waldsportplatz) für einen neuen Brunnen Sinn macht oder der Anschluss an das öffentliche Netz, bisheriger Zwischenstand ist eine dezentrale Versorgung bei zu behalten, der bestehende Brunnen am Sieben-Erlen-See muss regeneriert werden und zusätzlich eine Wasseraufbereitungsanlage erhalten



# Zentrale Trinkwasserenthärtungsanlage

- **Ziel:** das Trinkwasser von Karlsrufer-Neuthard weist einen Härtegrad von 18 Grad auf, eine zentrale Wasserenthärtung muss über eine Gebühreumlage finanziert werden, eine Studie soll aufzeigen welche technische Varianten wirtschaftlich sinnvoll und umsetzbar sind
- **GR:** Beauftragung des Ingenieurbüros am 03.05.16
- **Haushaltsstelle:** 2.7000.963000-003, 50.000 €
- **Stand:** Beauftragung der Studie ist bereits erfolgt, Startgespräch und vor Ort Besichtigung des Wasserwerks hat statt gefunden, Grundlagenermittlung läuft, erste Ergebnisse werden Anfang 2017 erwartet

19.01.

02.02.

23.02.

15.03.

12.04

03.05

# Generalentwässerungsplan (GEP)

- **Ziel:** Die zwei Hauptaufgaben der Gemeinde im Bereich des Abwassersystems sind Entwässerungssicherheit und Gewässerschutz, beide werden im Generalentwässerungsplan behandelt. Die Entwässerungssicherheit besteht darin die Gewissheit über die Leistungsfähigkeit der Kanalisation und die Vermeidung von Schadensfällen durch frühzeitiges Erkennen von Engstellen zu haben ebenso bei zukünftigen Erweiterungen oder Verdichtungen. Der Gewässerschutz beinhaltet die Vermeidung von Gewässerverschmutzungen und die Sicherstellung von ausreichendem Gewässerschutz ebenso wie für die Zukunft die Planungssicherheit bei den Regenwasserbehandlungsanlagen.  
**GR:** Beauftragung des Ingenieurbüros am 03.05.16  
**Haushaltsstelle:** 2.7000.963000-003, 50.000 €
- **Stand:** Beauftragung ist bereits erfolgt, mit der Grundlagenermittlung und Bestandsaufnahme wurde begonnen, erste Ergebnisse im Frühjahr 2017

19.01.

02.02.

23.02.

15.03.

12.04

03.05

# Hydraulische Berechnung Rohrleitungsnetz (Wasser)




- **Ziel:** Die Gesamtuntersuchung des Rohrnetzes wird unter Betrachtung verschiedener Betriebszustände durchgeführt und die maximalen Spitzenstunden- bzw. Löschwasserbelastung berechnet. Für das Wassernetz soll ein rechenfähiges Modellnetz, auf Grundlage der vorhandenen GIS Daten, erstellt werden. Anschließend erfolgt die Bestandsberechnung des Netzes, die Basis für die Analyse von Engpässen im Rohrleitungsnetz ist und die erforderliche Maßnahmen konzeptionell darstellt.
- **GR:** Beauftragung des Ingenieurbüros für die Versorgungskonzeption am 03.05.16
- **Haushaltsstelle:** EB Wasser 54710000, 80.000 €
- **Stand:** Beauftragung ist bereits erfolgt, mit der Grundlagenermittlung und Bestandsaufnahme wurde begonnen, erste Ergebnisse im Frühjahr 2017



# Sanierungsfahrplan / Quartierskonzepte




- **Ziel:** Sanierungsfahrplan erarbeiten um das Energieeinsparpotenzial der eigenen Liegenschaften darzustellen, Entwicklung einer übergreifenden Strategie für die zukünftige Energieversorgung, Energieberatung für Gebäudeeigentümer, Reduktion der CO<sub>2</sub> Emissionen, Förderung der Quartierskonzepte durch die KfW-Bank
- **GR:** Grundsatzbeschluss für ein integriertes energetisches Quartierskonzept in beiden Ortsteilen am 07.06.16
- **Haushaltsstelle:** 2.8170.940000, 40.000 €
- **Stand:** Grundsatzbeschluss ist erfolgt, Beantragung der Fördergelder für die Quartierskonzepte bei der KfW-Bank läuft, erste Gespräche für Nahwärmekonzepte und Bestandsaufnahme der Liegenschaften sind erfolgt, Zuschüsse der KfW in Höhe von ca. 142.000 € bewilligt



# Photovoltaikanlage am Wasserwerk

- **Ziel:** das Wasserwerk in Karlsdorf weist einen konstant hohen Stromverbrauch auf, dieser soll zukünftig überwiegend durch eine Photovoltaikanlage gedeckt werden
- **GR:** Vergabe Errichtung der Photovoltaikanlage am 07.06.16
- **Haushaltsstelle:** EB Wasser 10000, 140.000 €
- **Stand:** Entscheidung zur Auslegungsgröße der PV-Anlage auf 100 kWp ist getroffen, Änderung der Modulbelegung als Ost-West Ausrichtung, Vergabe der Arbeiten ist erfolgt, Abstimmungen mit der ausführenden Firma haben bereits statt gefunden, auf dem Baufeld verlaufende Wasser- und Elektroleitung sind vermessen, Beginn der Baumaßnahme Anfang November





# Ausbau des Wendehammers in der Lußhardtstraße OT Karlsdorf



- Ziel:** Für den Ausbau des Wendehammers besteht eine vertragliche Verpflichtung der Gemeinde gegenüber der Firma KIP. Die Planung wurde in der Gemeinderatssitzung am 10.02.2015 vorgestellt, wobei keine Mehrheit für die Gestaltung des Innenbereiches des Wendehammers zustande kam (Begrünung oder Pflasterbelag). Die Verwaltung machte daher den Vorschlag eines kombinierten Ausbaus mit Pflaster und Randsteinen im äußeren Radius und im Inneren eine Bepflanzung durchzuführen (siehe beispielhafte Darstellung).
- GR:** Beschlussfassung zu geänderter Planung des Wendehammers mit überfahrbarer Innenfläche in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am **28.07.2015**
- Haushaltsstelle** 2.6300.960000-007, 124.500 €
- Stand:** Finale Abstimmung mit Angrenzern hat statt gefunden, Werkplanung und Ausschreibung durch das Ingenieurbüro Nohe & Vogel in Arbeit, Teilgrundstück muss Gemeinde noch von DB erwerben



# Straßenerneuerung Friedhofstraße OT Neuthard

- **Ziel:** Erneuerung des Entwässerungskanals, der Druckrohrleitungen sowie der Straßenoberfläche und Gehwege
- **GR:** Vergabe der Entwässerungskanalarbeiten, Druckrohrleitungsarbeiten und Verkehrswegebauarbeiten (1. & 2. Bauabschnitt) am 12.04.16
- Haushaltsstelle 2.6300.960000-004, 367.000 €
  - 2.7000.960000-005, 170.000 €
  - EB Wasser 42000, 111.400 €
- **Stand:** mit dem 1. Bauabschnitt vom Friedhof bis zur Kreuzung Schulstraße wurde Ende Mai begonnen, in insgesamt 4 Bauabschnitten soll die Friedhofstraße bis Mai 2017 fertig gestellt sein, der 1. Bauabschnitt ist nahezu fertig gestellt



19.01.

02.02.

23.02.

15.03.

12.04

03.05

# Kreisverkehrsplatz Büchenauer Straße OT Neuthard



- **Ziel:** der bestehende provisorisch angelegte Kreisverkehr soll mit 50% Kostenübernahme durch den Landkreis ausgebaut werden, Baumaßnahme wird federführend vom Landratsamt durchgeführt
- **GR:** Beschluss in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am **21.04.2015**, Vorberatung über die Gestaltung des Kreisels in der Büchenauerstr. am 29.09.15, Vorstellung Entwurf Bepflanzung am 28.06.16
- Haushaltsstelle 2.6300.982000, 200.000 €
- **Stand:** Baumaßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung vom Landkreis steht noch aus, die Beauftragung für einen Entwurf der Bepflanzung wurde vorgestellt, lebendiges Biotop möchte eine Staudenbepflanzung realisieren



# Bau einer Querungshilfe im Bereich des Tiergartenweges / Im Pfad OT Neuthard


- **Ziel:** Sicherung des Fußgängerverkehrs, Reduzierung der Geschwindigkeit, Anordnung von zwei Fahrgastunterständen
- **GR:** Beschluss in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am **21.04.2015**
- Haushaltsstelle 2.6300.961000, 64.000 €
- **Stand:** Baumaßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus



# Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses



- **Ziel:** die Zusammenlegung der beiden Feuerwehren ist bis zum 3.10.2016 endgültig erfolgt (Zusammenlegung Jugend bis zum 01.01.2015, Altersmannschaft 01.01.16), um die freiwillige Feuerwehr Karlsrufer-Neuthard zukünftig leistungsfähig zu halten wird der Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses notwendig
- **GR:** Klausurtagung am 23.-24.10.15 zur Festlegung des Standortes Grundsatzbeschluss; GR am 12.04.16 Beauftragung KE mit Grundstücksanalyse und Architektenwettbewerb
- **Haushaltsstelle:** 2.1310.941000, 3.000.000 €
- **Stand: Abstimmung mit dem Regionalverband ist erfolgt,** Gespräch mit der KE am 15.03.16 über die weitere Vorgehensweise eines Architektenwettbewerbs, am 18.03.16 fand ein Informationsgespräch mit der Feuerwehr zur Projektabwicklung statt.  
Am 06.06. und 10.06.16 fanden Besichtigungen von verschiedenen Feuerwehrhäusern im Umkreis statt.  
Workshop mit der Feuerwehr am 18.06.2016. Wertgutachten für die potentiellen Grundstücke liegt vor.

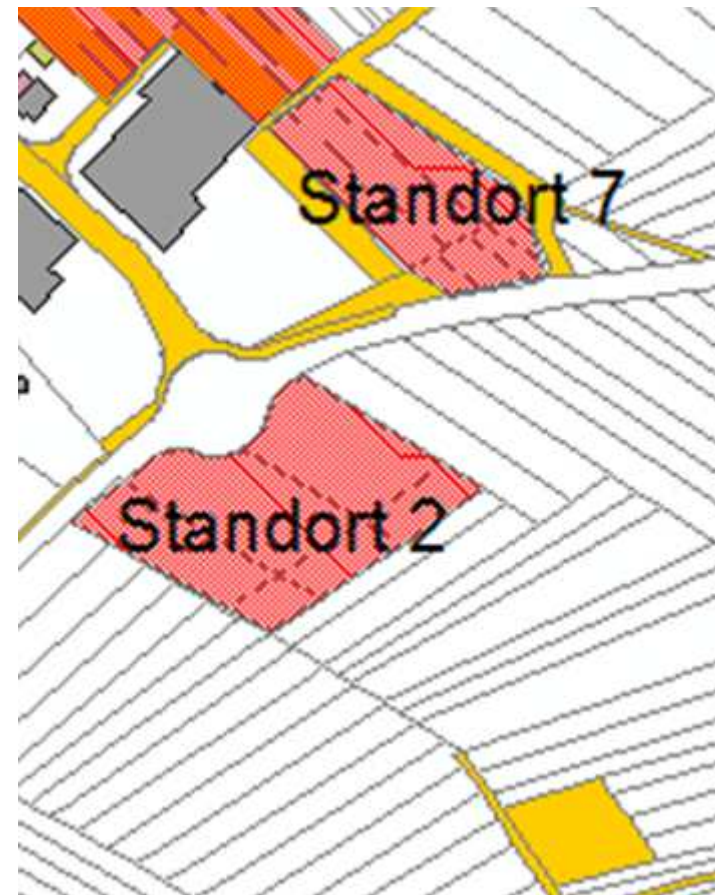

# Regenüberlaufbecken

- **Ziel:** die bisherige Straßenentwässerung war nicht mehr genehmigungsfähig, Gefahr eines Überstaus der Straßenentwässerung
- **GR:** Information am **24.03.2015**
- **Haushaltsstelle:** 2.7000.940000, 2.900.000 €
- **Stand:** Baumaßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus. Derzeit läuft noch die Klärung, ob festgestellte Geruchsbelästigungen durch das RÜB selbst oder durch die dortige Kanalisation hervorgerufen werden.



# Sanierungsmaßnahmen der Einsegnungshallen in beiden OT

- **Ziel:** Sanierungsstau in beiden Einsegnungshallen beheben, Erscheinungsbild bestmöglich verbessern mit vorhanden Haushaltsmitteln
- **GR:** Nichtöffentliche Vorberatung am **20.01.2015**
- **Haushaltsstelle:** 2.7510.941000, 116.000 €
- **Stand:** Angebote liegen vor, in Neuthard steht noch für einen Bereich das Ergebnis einer statischen Prüfung aus, lt. Statistik ist eine Erweiterung der Sitzplätze nicht erforderlich, der neue Hochbautechniker wird im Spätjahr die Maßnahmen sukzessive umsetzen



20.01.

10.02.

03.03.

24.03.

31.03.

21.04.

19.05.

# Bauhof

## Beschaffung Geräte / Fahrzeuge Bauhof

- **Ziel:** Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen um möglichst effizient die Arbeitsabläufe im Bauhof zu gestalten, durch Einsatz von Maschinen die Mitarbeiter körperlich entlasten
- **GR:** Vergabe Kommunaltraktor am 20.09.16
- **Haushaltsstelle:** 2.7710.935000, 72.500 €
- **Stand:** alle Maschinen bzw. Fahrzeuge sind bereits beschafft worden





# Friedhöfe: Ausweisung von Pflegegräbern/Alternative Bestattungsformen

- **Ziel:** Ausweisung von gärtnerbetreuten Grabfeldern auf beiden Friedhöfen, sowie Prüfung alternativer Bestattungsformen
- **GR:** Vorberatung in nicht öffentlicher Sitzung am 28.06.16
- **Haushaltsstelle** 2.7510.960000, 20.000 €
- **Stand:** Nach der Besichtigungsfahrt und dem Grundsatzbeschluss soll die Verwaltung ermächtigt werden, zusammen mit der Genossenschaft der Badischen Friedhofsgärtner Planungsentwürfe zu erarbeiten.



# Homepage: Relaunch von [www.karlsdorf-neuthard.de](http://www.karlsdorf-neuthard.de)



- **Ziel:** Anpassung der Homepage der Gemeinde im Hinblick auf Design und Inhalte
- **GR:** noch keine Beratungen im GR
- **Haushaltsstelle:** 1.0200.588000, 15.000 €
- **Stand:** Der Designentwurf liegt zur Umsetzung vor. Im Laufe des letzten Quartals wird mit dem Befüllen der Seiten begonnen werden. Danach erfolgt die Veröffentlichung!



# Sanierung der Rathäuser



- **Ziel:** Energetische Sanierung, Barrierefreiheit, modernes Erscheinungsbild und Lösung der Platzprobleme
- **GR:** nichtöffentlicher Sachstandsbericht am **10.02.2015**, **28.07.2015**, **03.05.2016**, **28.06.2016**
- **Haushaltsstelle:** 2.0200.940000, 739.000 €
- **Stand:** Entwurfsplanung für das Rathaus OT Neuthard liegt vor. Konzeptstudie für das Rathaus Karlsdorf wurde verworfen. Verhandlungen mit der Sparkasse Kraichgau zu Kooperation im Zuge des Verkaufs der Polizei. Sparkasse hat zur Planungskonzeption die Firma Südbau beauftragt. Entwurfsplanung für das Sparkassengebäude mit der Polizei liegt vor. Sparkasse und Polizei sind sich grundsätzlich einig, Interimslösung für die Polizei ist gefunden, zu klären ist, ob die Gemeinde ein 3. Geschoss im neuen Gebäude benötigt, danach Grundsatzentscheidung und Auswahl eines Architekten für das Rathausgebäude.



# Zeozweifrei Unterwegs

- **Ziel:** öffentlich/private Nutzung von 4 Elektrofahrzeugen in der Gemeinde mit Erstellung von Elektroladestationen  
Mitgliedschaft bei E-Carsharing-Portal „Stadtmobil“
- **GR:** Beratung + endg. Beschluss zur Teilnahme:  
23.06.2015  
Festlegung der Standorte: 22.09.2015  
→Bahnhofstraße  
→Lußhardtstr.  
→bei den Rathäusern in beiden Ortsteilen
- **Haushaltsstelle:** 2.7910.935000    60.000 €
- **Sachstand:** seit dem 30.09.2016 sind die ersten beiden E-Cars im Ort in Betrieb. Standorte sind die Bahnhofstraße und die Tullastraße beim Rathaus.
- Die nächsten Fahrzeuge werden im November ausgeliefert!



# Lärmaktionsplanung



- **Ziel:** Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zur Lärmaktionsplanung vor dem Hintergrund der Vermeidung von gesundheitsgefährdendem Lärm
- **GR:** 21.04.15 (nö) und 19.05.15 (öffentlich)  
15.03.2016 (nö), 07.06.2016 (öffentlich), 28.06.2015 (öffentlich)
- **Haushaltsstelle:** 1.6300.655000 (2015: 8.900 €)

**Sachstand:** Vorstellung im GR erledigt.


Bürgerversammlung im Juli 2015

Verfahren zum Lärmaktionsplan ab Sept. 2015

Öffentlichkeitsbeteiligung und TÖB's durchgeführt

Synopse erstellt

- Abschluss des Lärmaktionsplans mit Maßnahmenkatalog am 28.06.16



13/10/16

Sachstandsbericht aller Projekte | 3. Quartal 2016

29

# Breitbandausbau



- **Ziel:** schnelle und zukunftsfähige Internetanbindung über einen kommunal betriebenen Backbone
- **GR:** Vorstellung der Masterplanung im GR: Mai/Juni 2016
- **Haushaltsstelle:** 2.7610.960000                      174.000 €
- **Sachstand:**
  - GR 23.09.14 Vereinbarung kommunale Zusammenarbeit
  - GR 04.11.14 Info
  - GR 10.02.15 Info
  - GR 21.04.15 Grundsatzbeschluss und Auftrag Masterplanung 2016 Masterplanung für Neuthard beendet. In Karlsruhe kurz vor Abschluss
  - GR 22.09.15 Festlegung der POP-Standorte
  - GR 13.10.16 Festlegung eines zentralen Technikstandortes „Ochsenstall“
- GR 19.07.16 Vorstellung der Masterplanung
- Anbindung GE Ochsenstall an Datenautobahn: bis Ende 2016
- Laufende Kontrolle geplanter Tiefbauobjekte im Hinblick auf Kabelmitverlegung



# Einführung eines digitalen Rechnungslaufs



- **Ziel:** Die Verwaltung plant, zukünftig alle Eingangsrechnungen nur noch digital zu erfassen und zu bearbeiten.
- **GR:** noch keine Beratungen im GR
- **HH-Stelle:** 2.0200.935000 18.000 €
- **Sachstand:** Innerhalb der Verwaltung wurde bereits ein Workflow erarbeitet. Die Verarbeitungen der Rechnungen erfolgt im vorhanden DMS (Dokumenten Management System). Mit dem betreuenden Rechenzentrum (KIVBF) wurde betreffend der Umsetzung Kontakt aufgenommen. Da bisher erst eine Kommune im Gebiet der KIVBF einen „Digitalen Rechnungslauf“ eingeführt hat, ist die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard noch als **Pilotanwender** zu sehen. Aufgrund des Umstands dass zunächst die gesamte IT-Landschaft ausgetauscht wird, wurde das Projekt kurzzeitig hinten angestellt.

# Austausch der Soft- und Hardware



- **Ziel:** Austausch der gesamten Soft- und Hardware innerhalb der Verwaltung
- **GR:** noch keine Beratungen im GR
- **HH-Stelle:** 2.0200.935000: 65.000 €
- **Sachstand:** Mit unserem externen IT-Dienstleister wird derzeit die Ausschreibung vorbereitet. Vor dem eigentlichen Austausch im November 2016 soll das Funknetz modernisiert und die Geschwindigkeiten der „Außenanbindungen“ erhöht werden. Hierzu wurden bereits UnityMedia Anschlüsse in den Rathäusern installiert. Inzwischen wurde auch ein IT Konzept erstellt und entsprechende Angebote angefordert. Der Auftrag ist in der Sitzung vom 19.07.2016 erteilt worden.
- Der Austausch erfolgt im November




# Zehntscheune

- **Ziel:** Die Zehntscheune gehörte zum Gestüthof Altenbürg und zählt damit zu einem der ältesten noch vorhandenen Gebäude in Karlsdorf. Über das ehrenamtliche Engagement soll ein wirtschaftliches Konzept zur Erhaltung der Zehntscheune erarbeitet werden.
- **GR:** nichtöffentliche Vorberatung am 13.10.2015, Klausurtagung 2015, 06.04.16 (Vorberatung im Ältestenrat) 12.04.16 (Grundsatzbeschluss zum Kauf mit Bedingungen), 28.06.16, 19.07.16 (nö)
- **Haushaltsstelle:** ---
- **Stand:** Eine Projektgruppe hat eine Konzeption zum Erhalt der Zehntscheune im Rahmen einer Bürgerstiftung Karlsdorf-Neuthard entwickelt, die nach dem Gemeinderat auch interessierten Unternehmern und Privatpersonen vorgestellt wurde. Alle Beteiligten würden sich nachhaltig persönlich engagieren. Projektgruppe und Interessierte. Treffen sich am 27.07.16



Vereinsgründung am 03.08.16.

Bürgerfest am 07.10.2016



13/10/16

Sachstandsbericht aller Projekte | 3. Quartal 2016

33

Darüber hinaus hat sich die Verwaltung mit folgenden Themen beschäftigt:

- PIT Kommunal
- Kaufpreissammlung
- Neues Haushaltsrecht
- Regie 68
- Weg Holzlagerplatz Gredler & Söhne
